



Ajuntament  
de Barcelona

# CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2025

19 de juny de 2025  
[comiteobres@bcn.cat](mailto:comiteobres@bcn.cat)



# ÍNDEX

1. Valor social de les obres de l'Estiu 2025
2. Plànol de les Obres d'Estiu 2025
3. Comparatiu de les obres d'Estiu (període 2015 - 2025)
4. Actuacions que finalitzen
5. Urbanitzacions
6. Infraestructures del transport
7. Pavimentacions
8. Infraestructures de serveis: Serveis d'elèctriques / aigua potable / gas natural / sanejament / Districlima
9. Pla de manteniment integral
10. Pla endreça obres d'estiu



# 1. Valor social de les obres de l'estiu 2025

- Actuacions de millora de la qualitat de l'espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.
- Execució d'obres a l'estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat, amb poca activitat docent i esportiva.
- Planificació de les obres per produir menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes.
- Pla Endreça Obres: hi haurà una major supervisió i control del compliment de les condicions de qualitat de les obres amb més impacte.



# 1. Valor social de les obres de l'estiu 2025

- Fases rellevants en l'execució de les obres de perllongament de l'L8 de FGC i les de l'L9 de metro, així com intervenció de millora de la infraestructura de l'L4, l'L11 i l'L2.
- Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans: cobertura de la Ronda de Dalt i continuació de les urbanitzacions de la Meridiana, Balmes o la Rambla.
- Finalització d'urbanitzacions que milloren la qualitat als barris i la mobilitat: Via Laietana, Jardinets de Gràcia, Gran Via entre les Glòries i Bilbao, carrer d'Europa o el carril bus de la B-23.
- Actuacions en el marc del Pla de Manteniment Integral per garantir el bon funcionament de l'espai públic, controlant l'obsolescència de les instal·lacions i evitant les incidències i el deteriorament: 7 actuacions de pavimentació.



## 2. Plànol de les Obres d'Estiu 2025



ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT


### PLÀNOL DEL CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2025

Data d'actualització: 29 / 05 / 2025

Escala de planta general 1 : 40.000 / Escala de detall 1 : 60.000 / Format Din A3

#### LEGENDA

- Infraestructures del transport
- Pavimentació
- PMI
- Urbanització
- Serveis

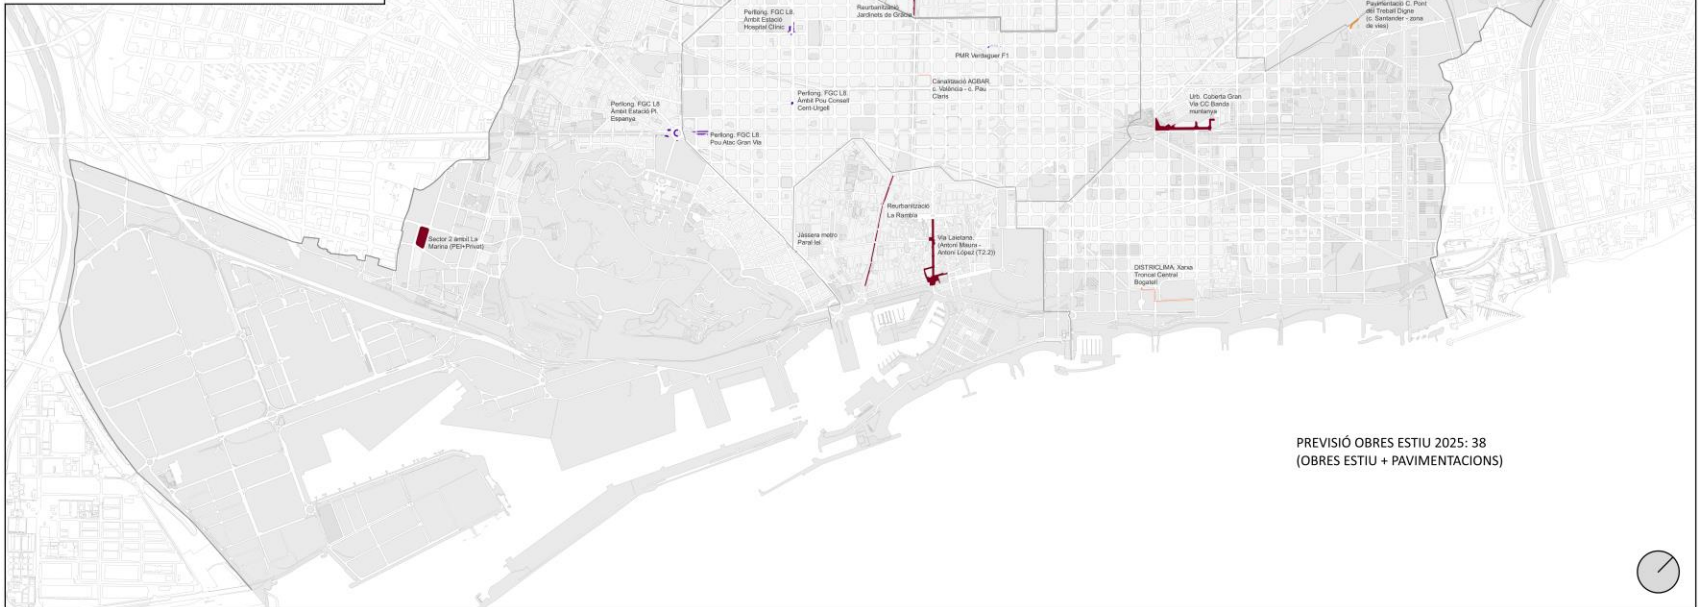


PREVISIÓ OBRES ESTIU 2025: 38  
(OBRES ESTIU + PAVIMENTACIONS)






### 3. Comparatiu de les obres d'estiu (període 2015 a 2025)

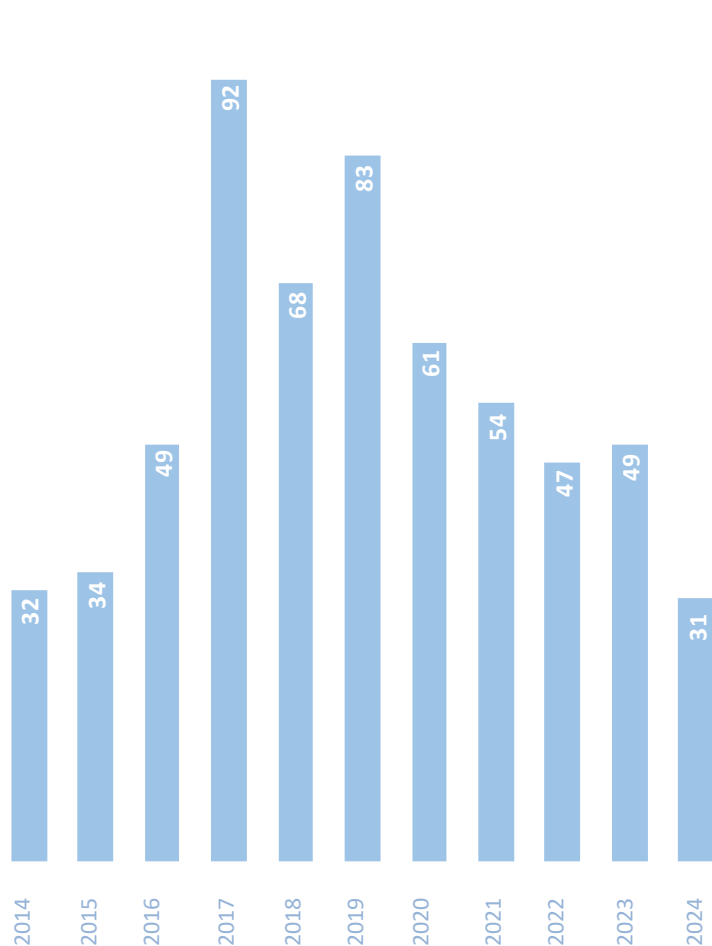


Obres d'estiu  
(sense pavimentacions)

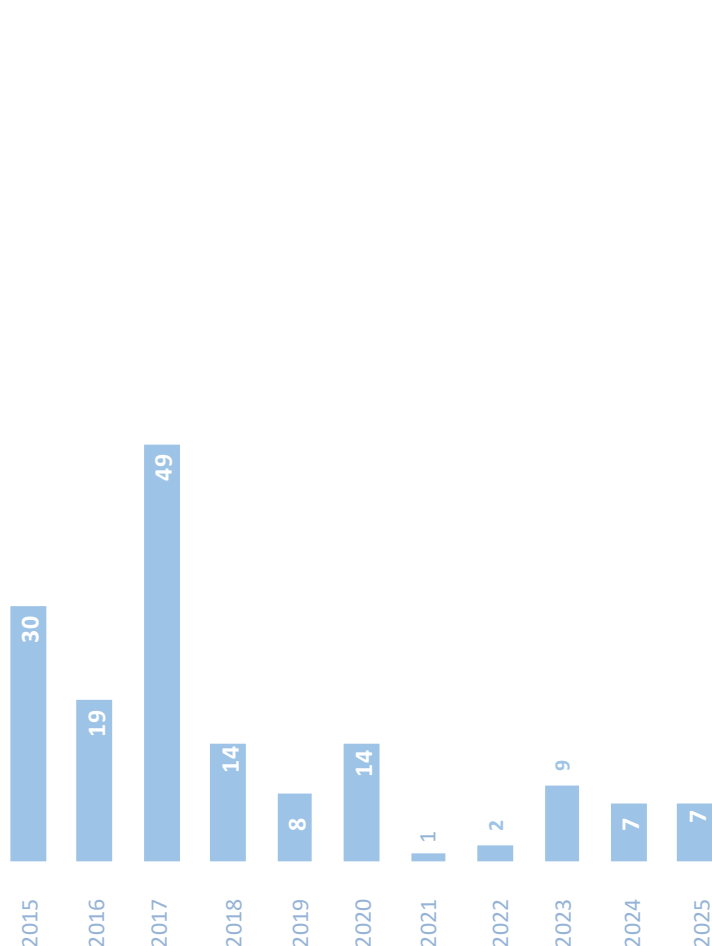

Pavimentacions





### 3. Comparatiu de les obres d'estiu (període 2015 a 2025)

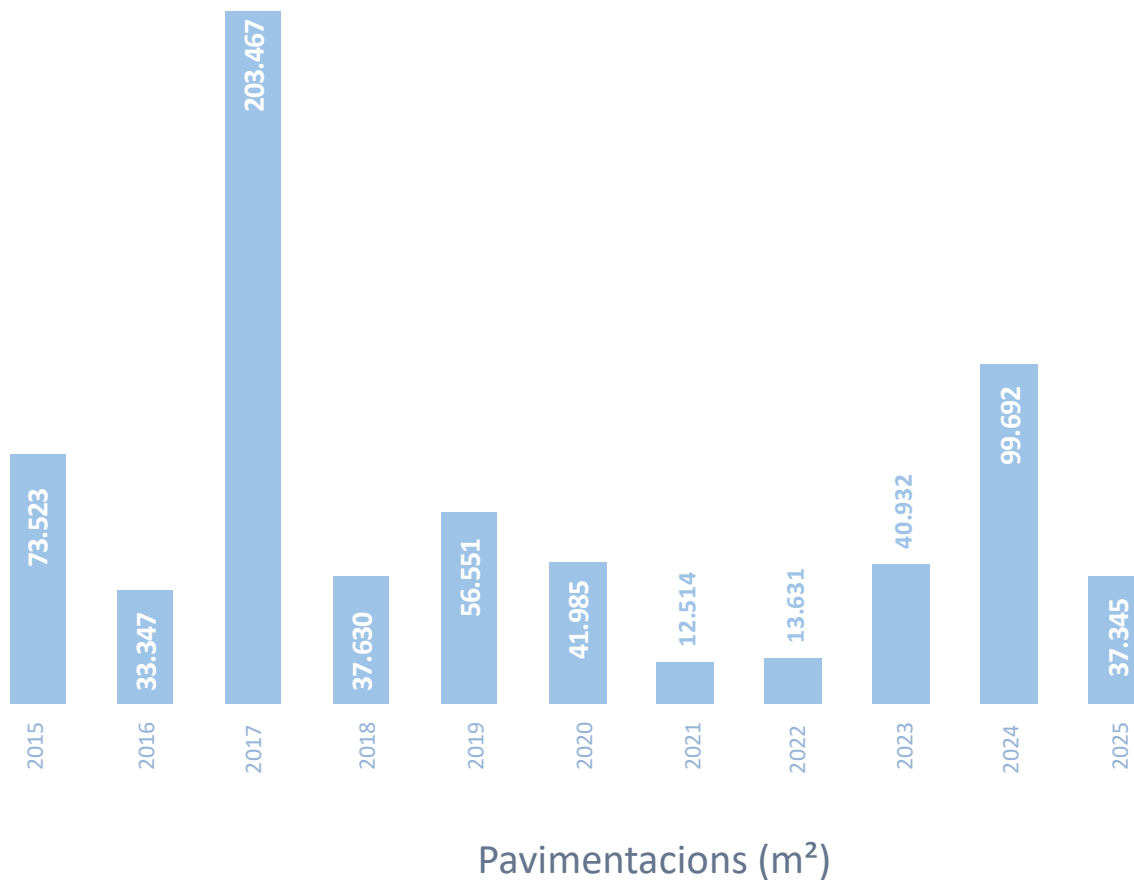




## 4. Actuacions que finalitzen

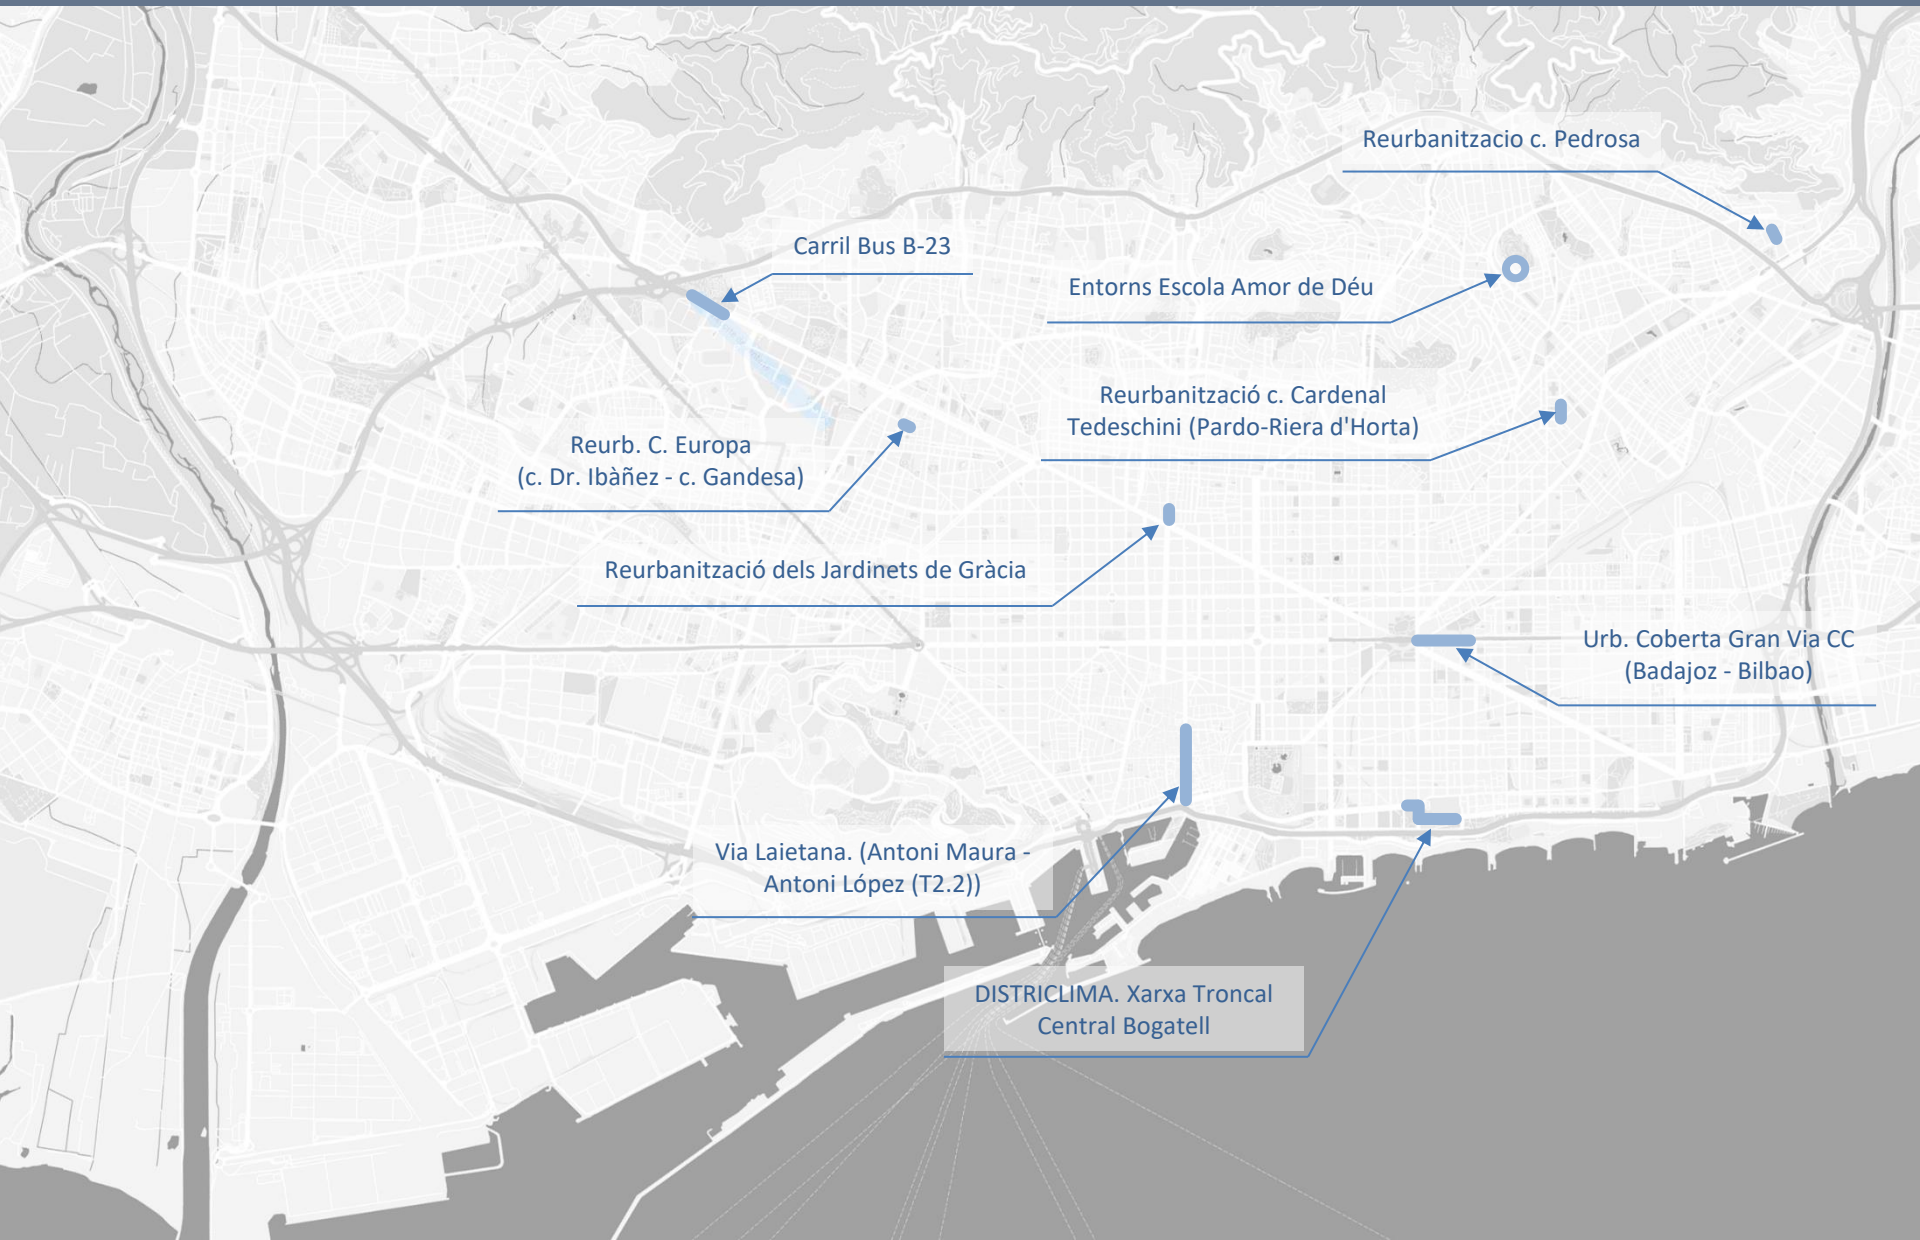

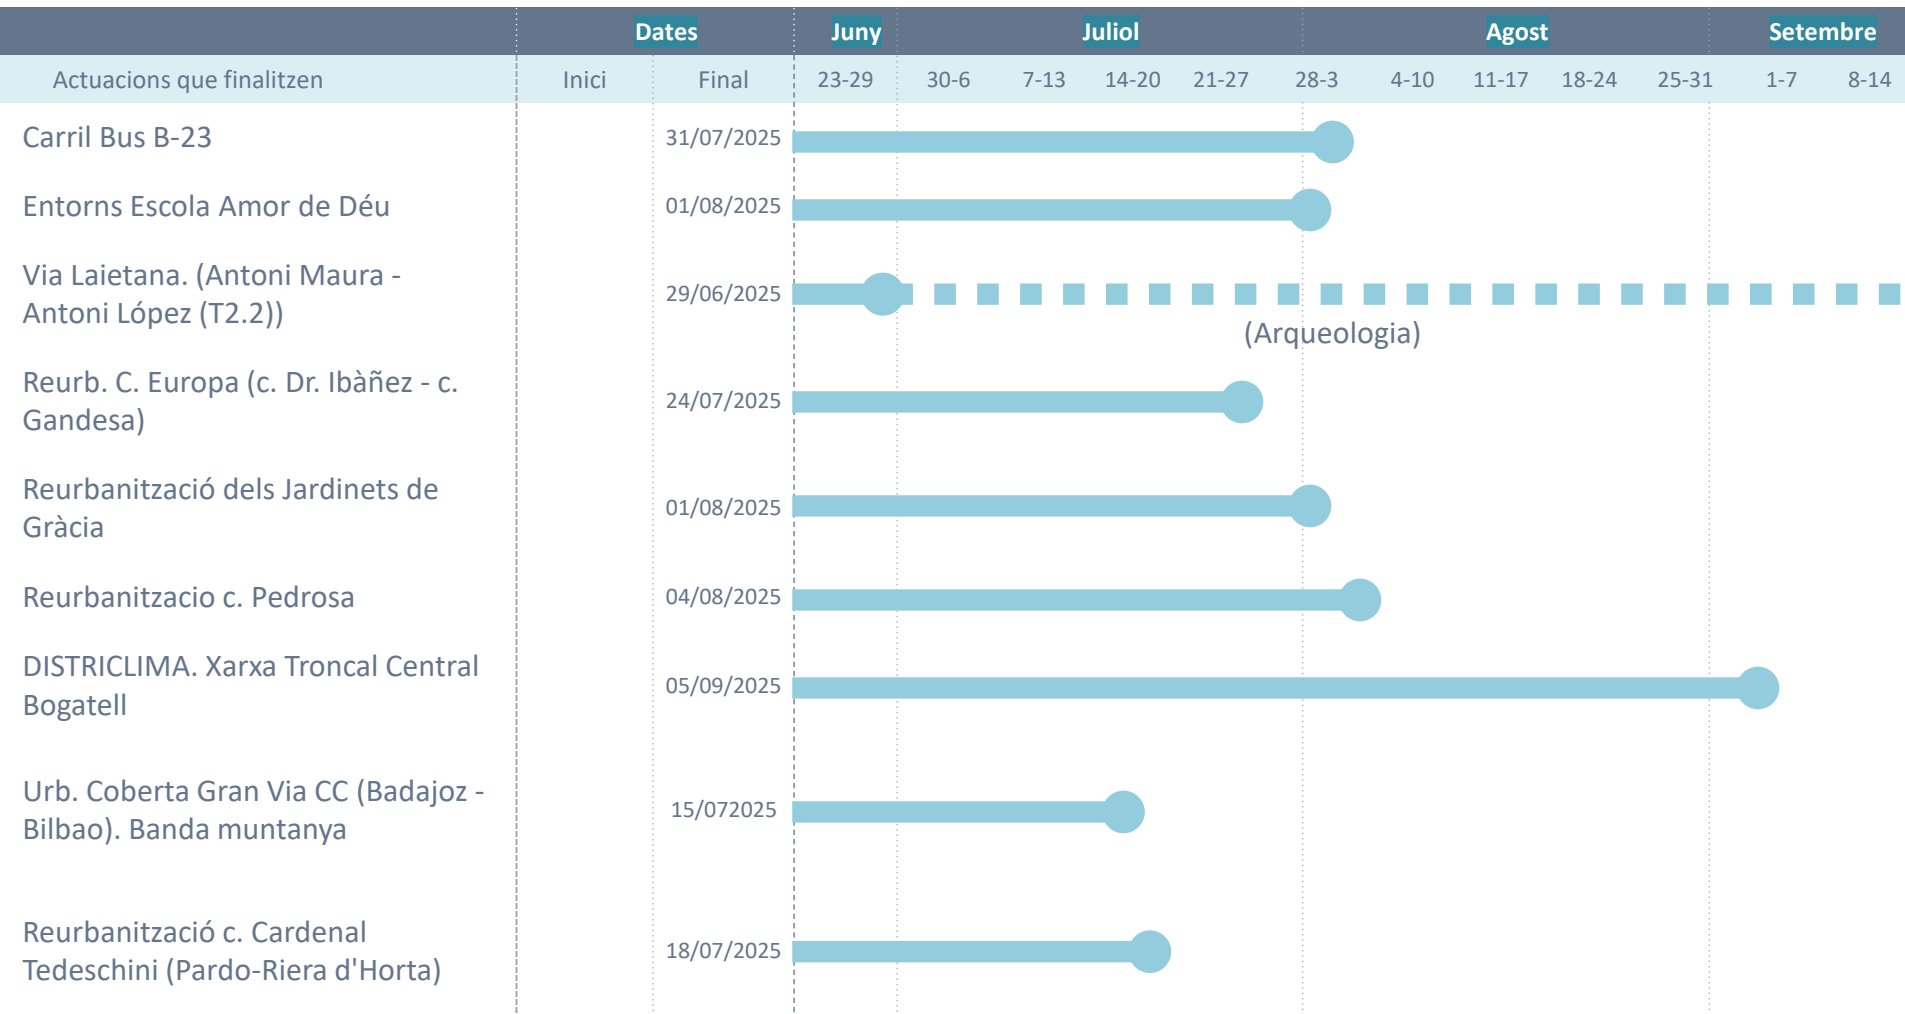



## 5. Urbanitzacions

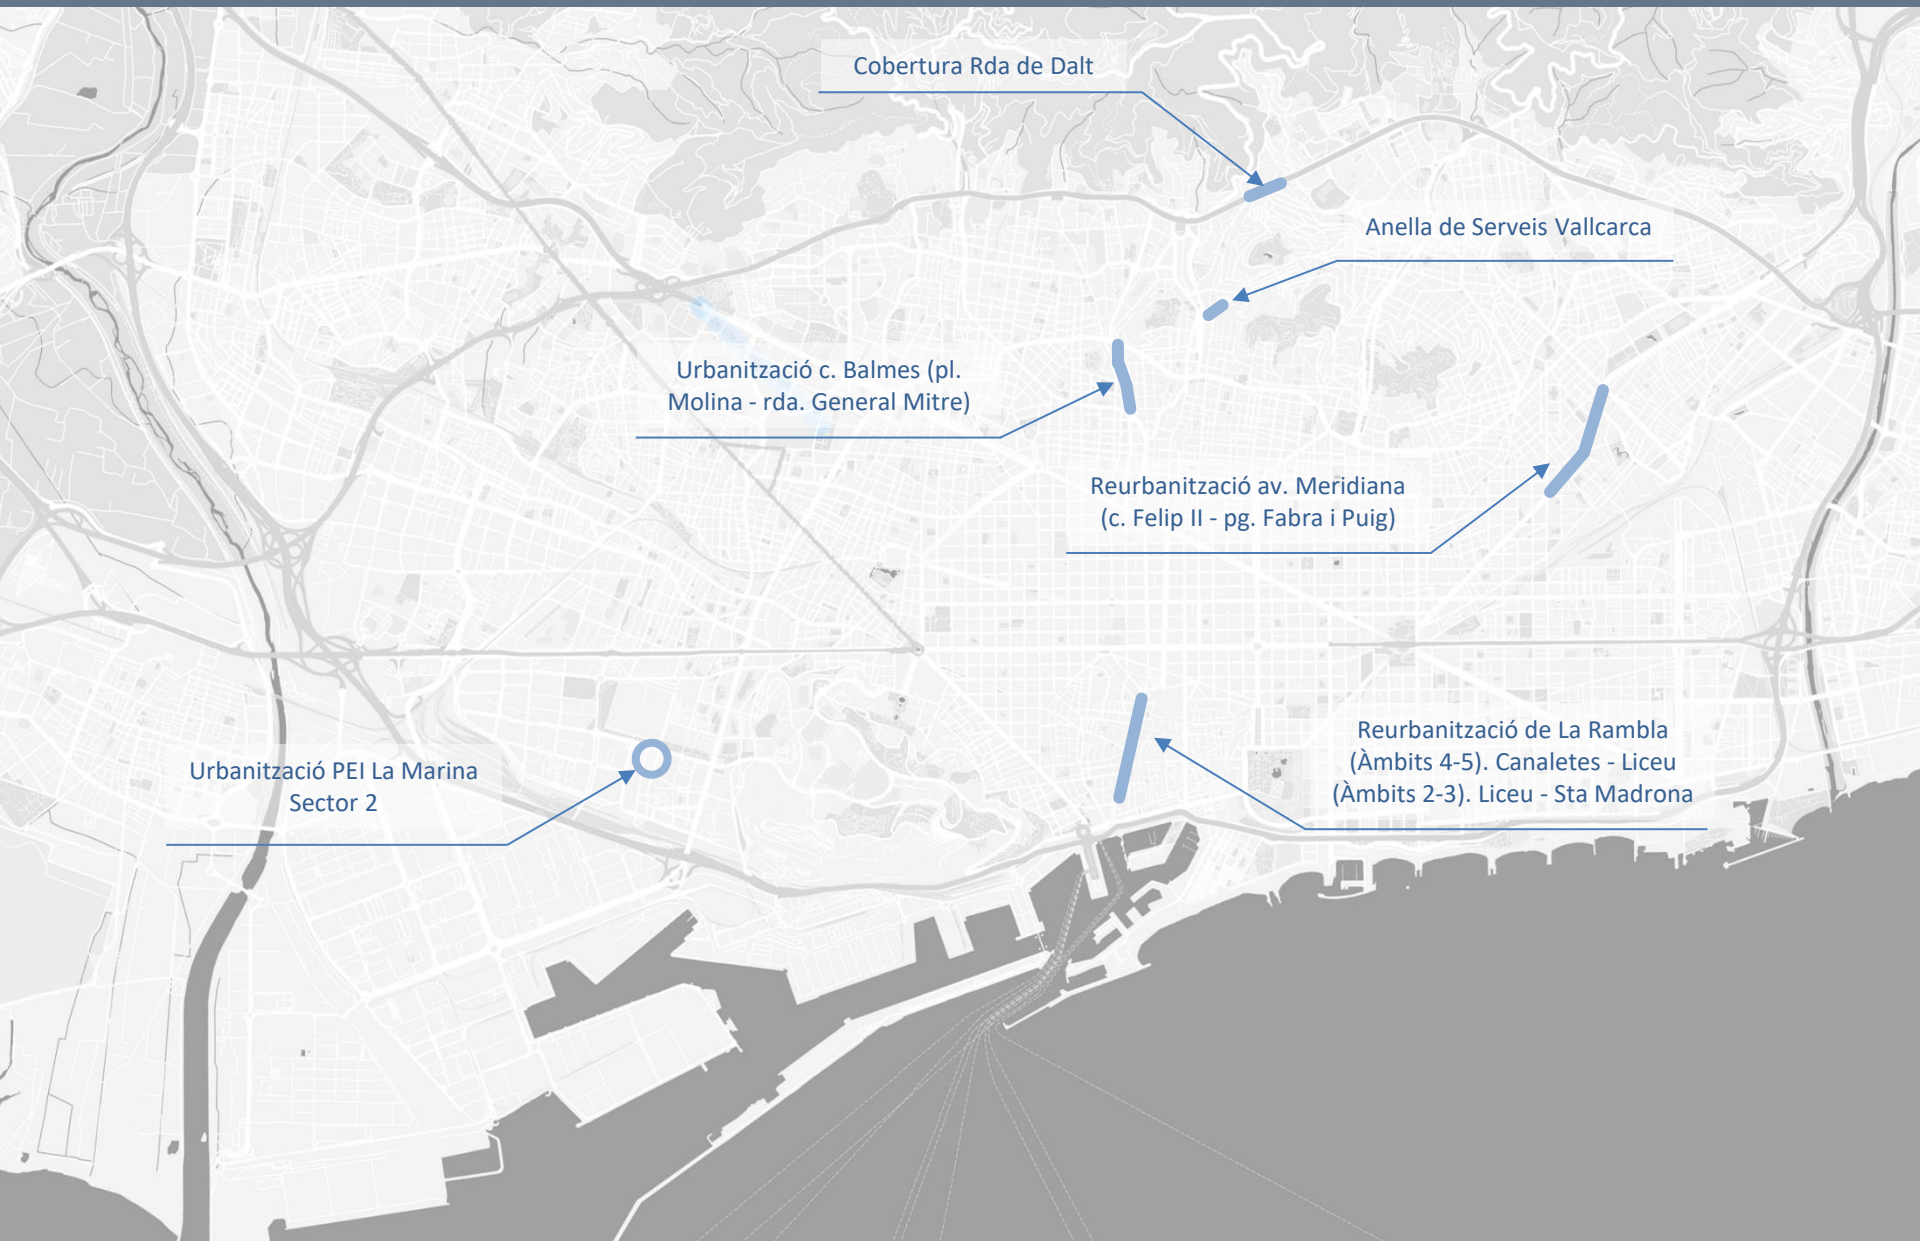



# Reurbanització de La Rambla (Àmbits 4-5). Canaletes - Liceu (Àmbits 2-3). Liceu - Sta Madrona

## Urbanització de la Rambla. Costat Raval

Del **28/05/2024** al **22/02/2027**

- Per reduir al mínim les afectacions, al llarg de les tres fases les obres es desenvoluparan en trams acotats d'uns 50 metres
- A mesura que es vagin acabant s'aniran abordant nous trams.

Canvi de costat el **16/06**. A actuar al costat Raval, mantenint 1c en sentit ascendent al costat Gòtic.

### **Pas c. Portaferrixa**

Canvi de sentit de circulació del Raval cap al Gòtic.

### **Pas c. Ferran**

Canvi del sentit de circulació del Raval cap al Gòtic. Pas exclusiu de vehicles que surten del c. Unió.

### **Pas Boqueria**

Circulació sentit Raval. Es farà un carril d'espera pel gir sobre la rambla central.

### **Carrer Nou de la Rambla**

Sentit Raval, el gir a esquerra es farà sense un carril d'espera.

### **Pas Escudellers**

Sortida sentit ascendent i eliminació del pas sobre La Rambla.

**Treballs de prospecció arqueològica de la muralla**  
Del **14/07** al **28/11**  
Ocupació del tram central de la Rambla per meitats.



# Urbanització c. Balmes (pl. Molina - rda. General Mitre)

**Afectació Rda. General Mitre. Agost**  
Perllongament de la mitgera central, amb l'ocupació d'1c per sentit.

**Ocupació del tram central**  
**Del 9/06/2025 a 8/08/2025**

La configuració a partir del 9/06 és d'1c descendent de 3,2 m + ocupació de l'obra amb NJ a banda i banda + 1c de 2,30 m i 1c carril de 2,80 m en sentit ascendent. Afectacions puntuals als girs dels carrers transversals.

**Fase 3, a partir del 8/08/2025**

Ocupació banda Besòs mantenint 1c descendent i dos ascendents.



# Anella de Serveis Vallcarca

## Del 22/04/2025 i el 31/01/2026

Tall de trams de 50 m del c. Mare de Déu del Coll, quedant en atzucac des del c. Farigola fins al carrer de Medes.

El desviament és Torrent del Remei - Sant Eudald – plaça Mons – Viaducte de Vallcarca – av. República Argentina.

Canvi del sentit de circulació del c. Balears entre Sant Eudald i Farigola per poder donar sortida a vehicles.

Afectació línia 87 de bus.

## Cruïlla c. Farigola amb c. M. Déu Coll

De l'01/08/2025 al 31/08/2025

Tall de la cruïlla mantenint la circulació habilitada del c. Farigola.

Afectació a l'escola La Farigola de Vallcarca.

## Treballs d'urbanització als carrers Argentera, Calendau i Cambrils

Les actuacions es duran a terme de manera consecutiva, seguint l'ordre següent: Argentera, Calendau i Cambrils.



# Cobertura Ronda de Dalt

## Reducció de carrils a Ronda de Dalt

Del **14/07** al **4/09**. Treballs d'execució de les portes de les sortides d'emergència:

- S'ocuparà un carril per sentit deixant 2c a cada calçada des de l'accés 5 a l'accés 6.
- Talls puntuals nocturns.

## Afectacions en superfície

Per millorar el trànsit en els laterals superiors, es restabliran els carrils i la vorera del costat muntanya, alhora que es reobrirà la rotonda del c. Arenys, actualment tancada.



# Reurbanització av. Meridiana (c. Felip II - pg. Fabra i Puig)

## Entrada

Es fa la restricció esglaonada de 4 a 3, i de 3 a 2c. El carril de incorporació a l'estació de bus es manté habilitat.

## Carrer Cardenal Tedeschini

Atzacac entre Emilia Pardo Bazàn i Meridiana.

## Carrer d'Olesa

Canvi de sentit entre Cienfuegos i Garcilaso.  
Atzacac entre Cienfuegos i Meridiana.

## Fase estiu. Del 27/07 a 08/09/2025

La configuració de trànsit serà de 2c per sentit (2,9 + 3,2 m) separats amb l'ocupació central en illa protegits amb NJ i tanca rivisa, amb els passos de vianants semaforitzats.  
Implantació mantenint 1c per sentit a la nit del 27 a 28/07 sentit sortida i 28 a 29/07 sentit entrada.

## Bicis

L'ocupació s'ampliarà en vorera i les bicis seran desviades al carril bici provisional de c. Concepció Arenal.

## Carrer Antilles

Atzacac entre el carrer de Filipines i Meridiana.

## Bus

Les parades de bus es traslladen a l'alineació de vorera definitiva.

## Sortida


Es fa la restricció del carril esquerre de 3 a 2c.



|                                                                                               | Dates      |            | Juny                                                                                           |     | Juliol |       |       |      | Agost |       |       |      | Setembre |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|----------|------|
| Inici de les Urbanitzacions                                                                   | Inici      | Final      | 24-30                                                                                          | 1-7 | 8-14   | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5-11  | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8      | 9-15 |
| Reurbanització de La Rambla (Àmbits 4-5). Canaletes - Liceu (Àmbits 2-3). Liceu - Sta Madrona | 28/05/2024 | 22/02/2027 | (Perllongament de la mitgera central de la Rda. General Mitre, amb l'ocupació d'1c per sentit) |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |
| Urbanització c. Balmes (pl. Molina - rda. General Mitre)                                      | 16/10/2024 | 27/03/2026 | (Ocupació de 2c banda mar del c. Foc, mantenint habilitat 1c per sentit)                       |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |
| Urbanització PEI La Marina. Sector 2                                                          | 26/05/2025 | 12/11/2026 | (Tall de la cruïlla c. Farigola amb c. M. Déu Coll)                                            |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |
| Anella de Serveis Vallcarca                                                                   | 22/04/2024 | 31/01/2026 | (Ocupació carril dret deixant 2c per sentit)                                                   |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |
| Cobertura Rda de Dalt                                                                         | 9/05/2025  | 9/05/2027  | (Ocupació central en illa, mantenint habilitats 2c per sentit)                                 |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |
| Reurbanització av. Meridiana (c. Felip II - pg. Fabra i Puig)                                 | 10/04/2025 | 9/12/2025  |                                                                                                |     |        |       |       |      |       |       |       |      |          |      |



## 6. Infraestructures del Transport

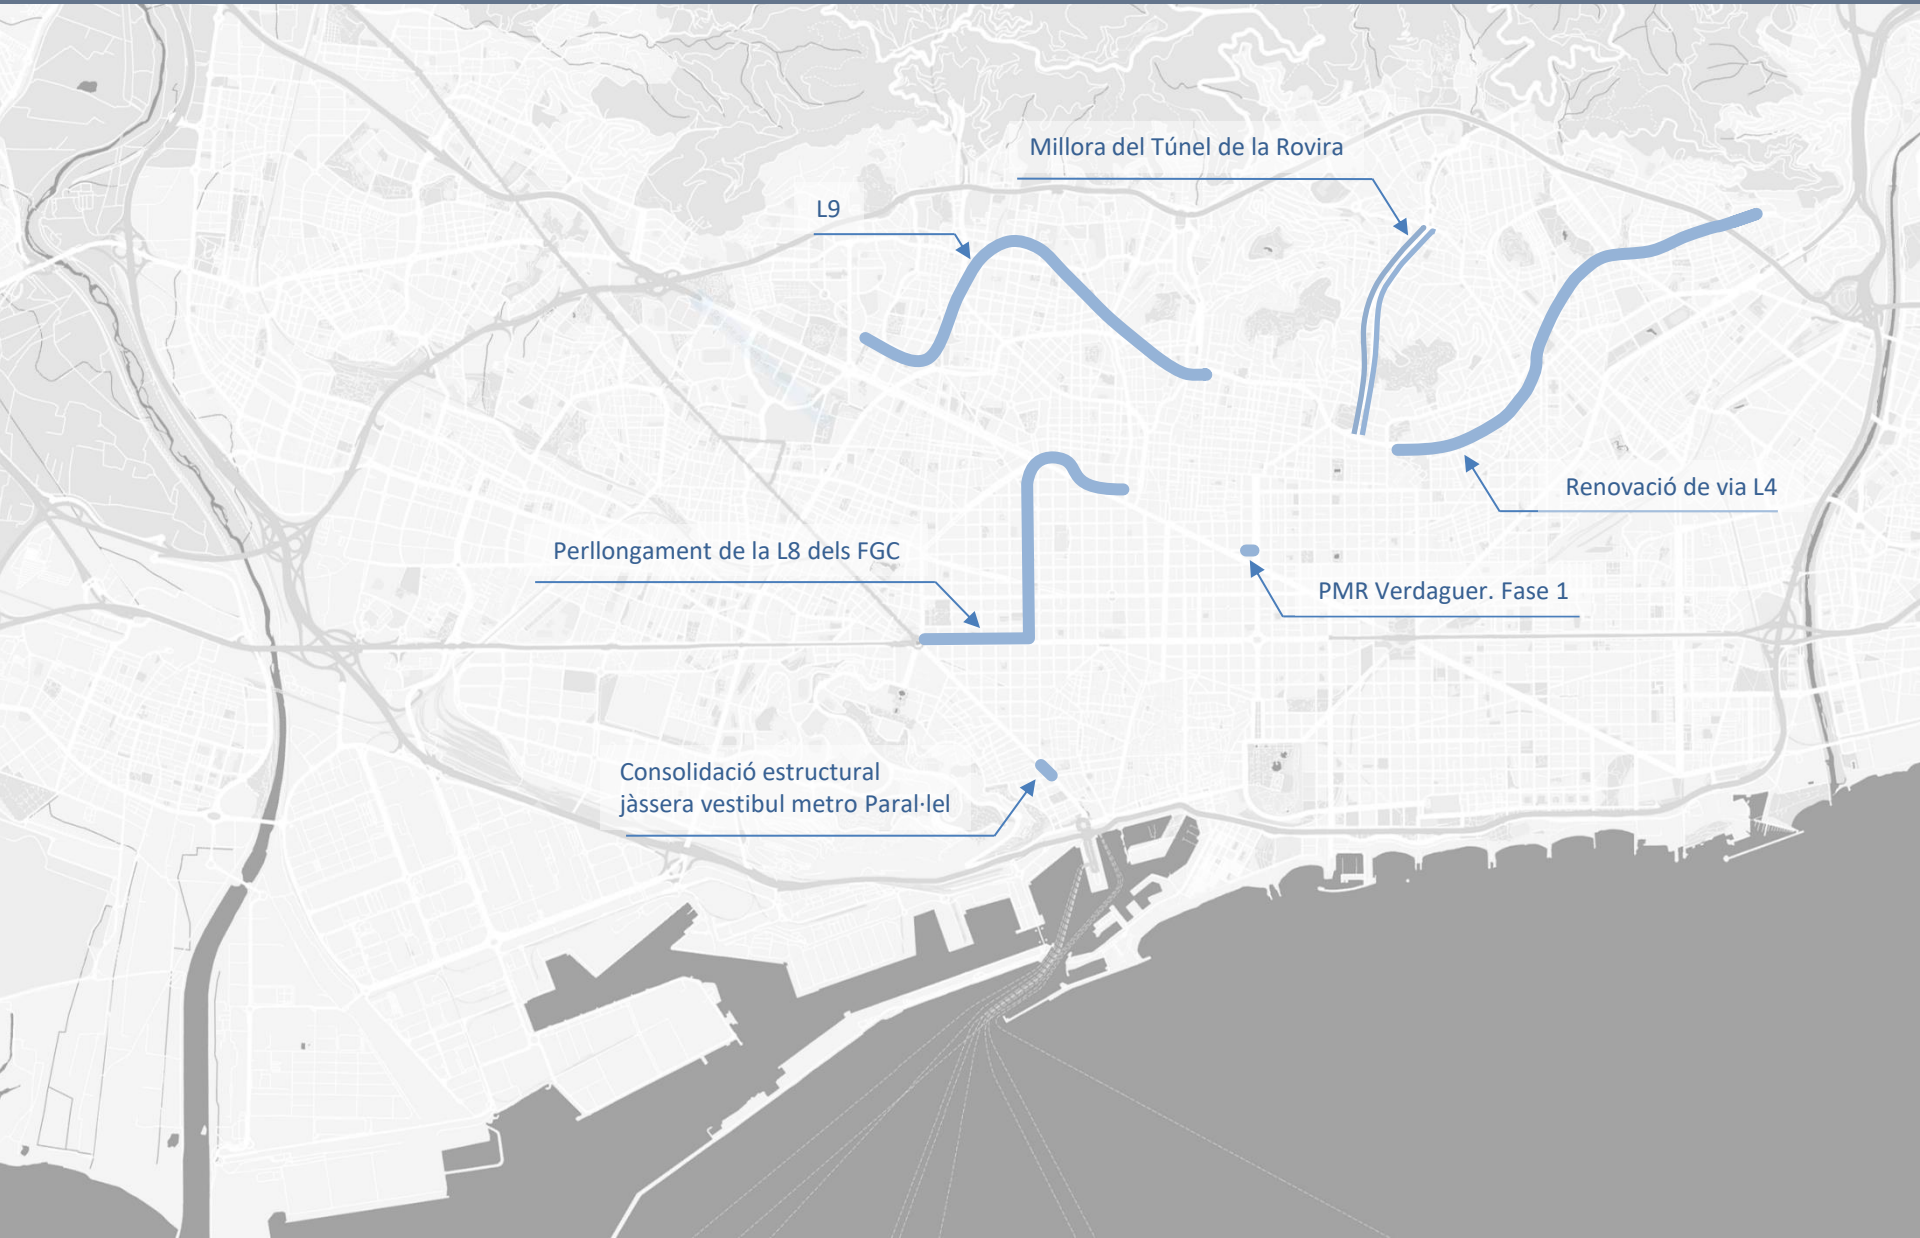



# Perllongament de la L8 dels FGC





# Perllongament FGC L8. Sortida d'emergència Muntaner

## Sortida Via Augusta

Adaptació de semàfor i senyalització

## Via Augusta

Habilitar 2c de circulació per sentit amb la retirada del cordó de Serveis banda muntanya, entre el c. Brusi i c. Muntaner. Eliminació del gir sentit muntanya al c. Brusi i habilitar gir sentit muntanya al c. Balmes.

## Carrer de Muntaner

Habilitar cordó de serveis al costat Besòs entre Via Augusta i Laforja, i al costat Llobregat entre c.Rector Ubach i c. Calaf.

## Carrer dels Madrazo

Desviament del bus V13 i adaptació del cordó de serveis.

## Carrer d'Amigó

Canvi a sentit descendent entre Travessera i Via Augusta el 27/07

Tall entre el c. Laforja i el c. Marià Cubí.  
Del 10/08/25 a 31/08/26


Tall entre el c. Marià Cubí i c. Avenir.  
Del 31/12/25 a 31/08/26

## Travessera de Gràcia

Adaptació del pas de vianants, semàfors i senyalització



L9

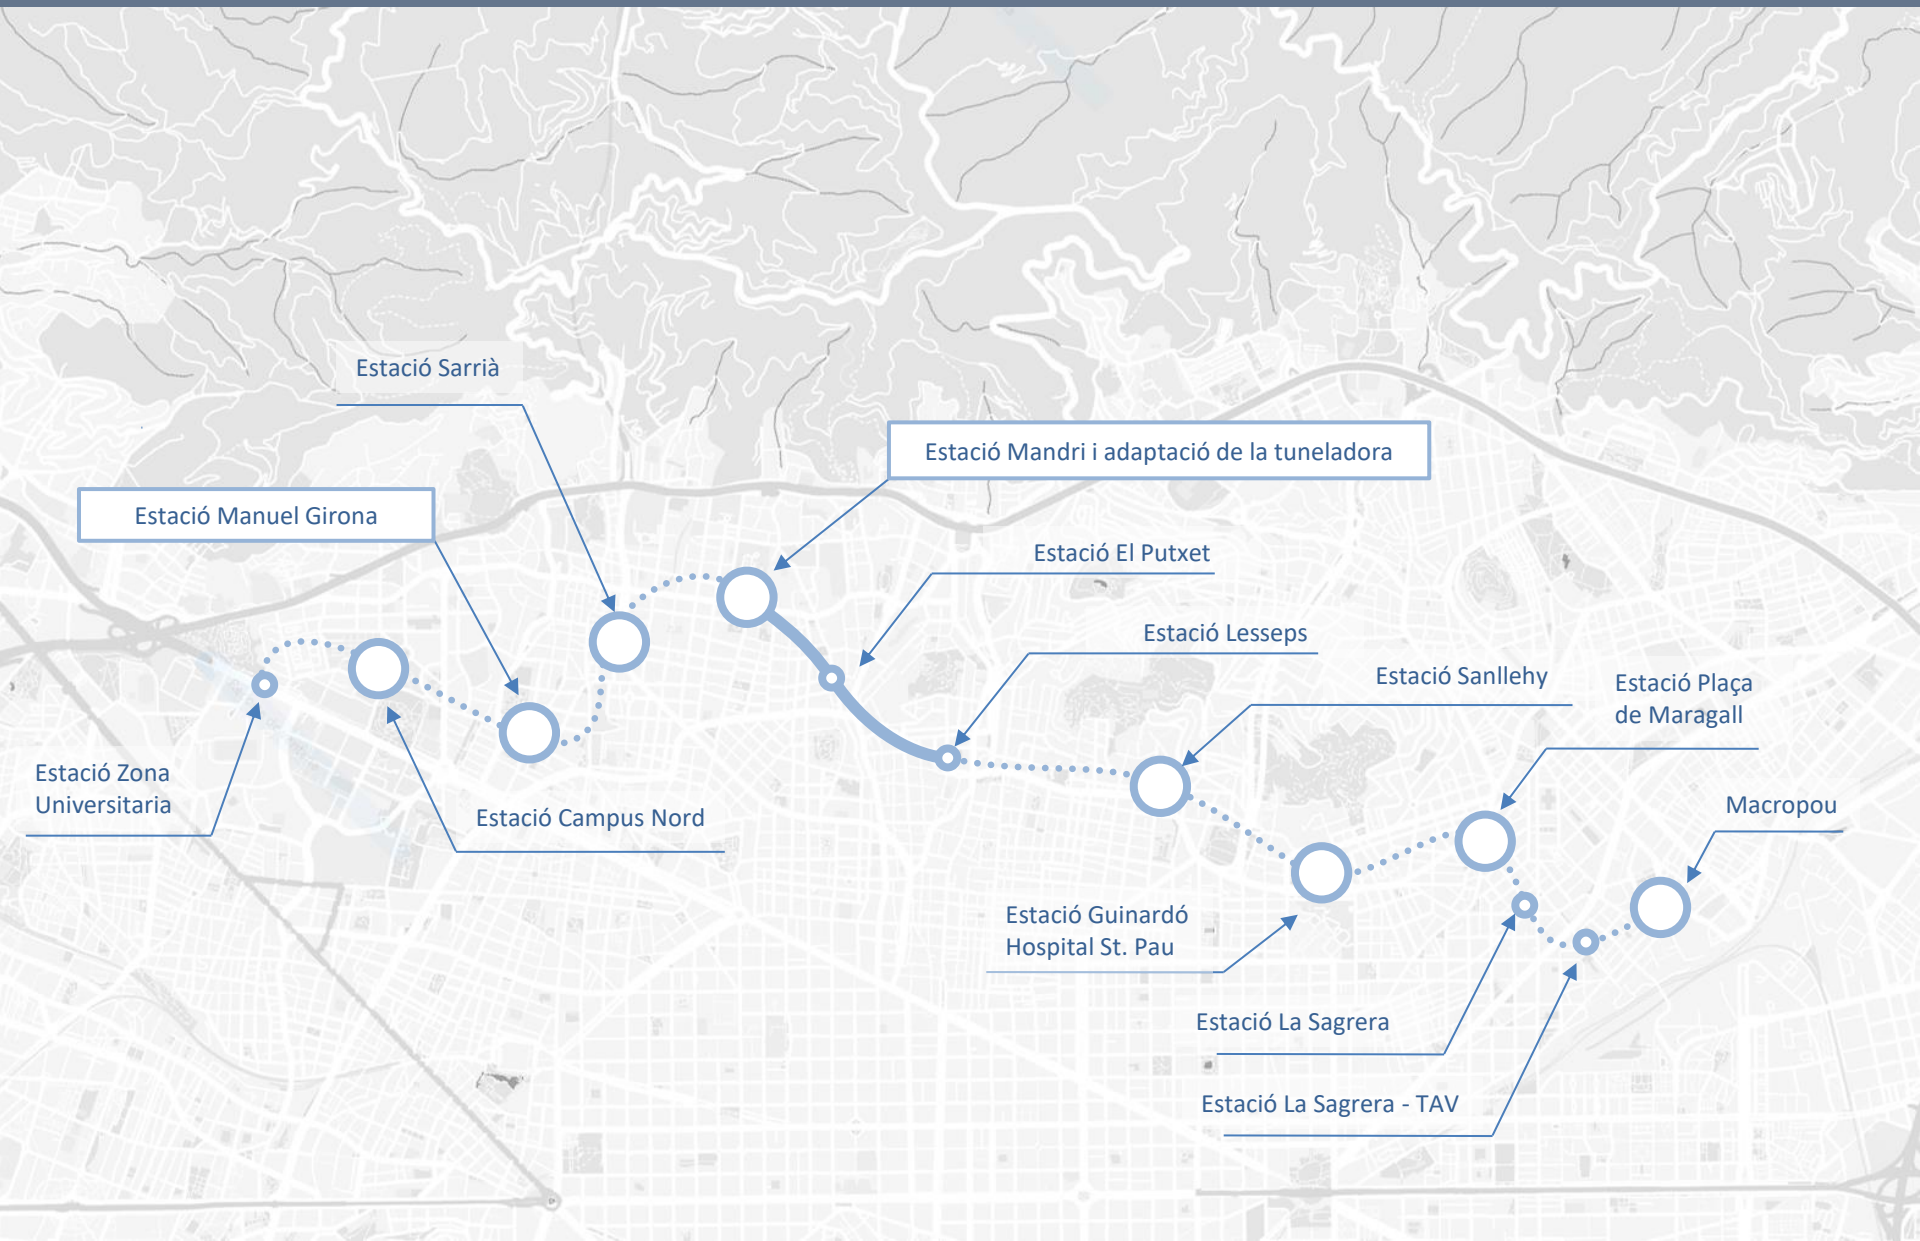



## L9. Estació Manuel Girona

### Fase 1. del 30/06 a 04/08/25

C. Dr. Ferran, tall dels 2c ascendents, mantenint habilitat els 2c descendents i el carril amb terminal de bus del costat Llobregat.

Pg. Manuel Girona, ocupació del cordó de serveis i vorera banda mar, sense afectar els 2c de circulació.

Tall dels passos de vianants i instal·lació d'un nou pas provisional semaforitzat abans de l'ocupació.  
c. Eduardo Conde. Reubicació de parada de Taxi.

### Fase 2. del 04/08/25 a fi d'obra

C. Dr. Ferran, tall total entre pg. Manuel Girona i c. Manila.

Desviament sentit ascendent: c. Manila – c. Capità Arenas – av. Diagonal – pl Pius XII – av. Pedralbes.

Desviament sentit descendent: pg. Manuel Girona – av. Pedralbes – pl Pius XII – av. Diagonal.

### **Bus:**

Línia 6. El desviament serà pg. Manuel Girona - c. Capitán Arenas. S'habilitarà la terminal al pg. Manuel Girona entre el c. Capità Arenas i el c. Benet Mateu.

Línia 34. El desviament serà c. Santa Amèlia – c. Capità Arenas. S'habilitarà la terminal al c. Capità Arenas, entre el c. Francesc Carbonell i el pg. Manuel Girona.

Línia V3. El desviament de l'itinerari serà c. Eduardo Conde – c.Santa Amèlia – c.Capità Arenas.

Línia 130. Es reubicarà una parada al c. d'Eduardo Conde.

### **Vianants:**

Les voreres Llobregat del c. Dr. Ferran i mar del pg. Manuel Girona estaran tallades.

Al c. Dr. Ferran els vianants seran desviats per façana al costat Besòs i al c. Pedro Pons al costat Llobregat.



# Consolidació estructural jàssera vestibul metro Paral·lel

**Fase 1. Del 04/08/25 a 10/08/25**

**Fase 2. Del 10/08/25 a 17/08/25**

Implantació el 03/08 mantenint 1c per sentit.

Ocupació del c. bus + 1c + cordó de serveis a cada sentit. Es mantindrà habilitat en tot el moment 1c de circulació de 3,50 m a cada sentit i el carril bici bidireccional. La vorera banda mar estarà parcialment ocupada, deixant un pas mínim de 1,80 metres per als vianants.



# Renovació de via i senyalització L4 (Maragall - Trinitat Nova)

## Tall de servei L4

### Fase 1. del 25/06 a 31/08

Sense servei entre Verdaguer i Trinitat Nova.

Sense servei entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua (L11).

### Fase 2. del 01/09 a 07/09

Sense servei entre Maragall i Trinitat Nova.

Sense servei entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua (L11).

Ocupació 4  
del 19/06 a 04/08/25

Ocupació 6  
del 26/06 a 04/08/25

Ocupació 11  
del 25/06 a 11/08/25

Extracció de Balast  
del 16/06 a 19/09/25

Ocupació 10  
del 12/06 a 04/08/25

Ocupació 8  
del 12/06 a 19/09/25

Ocupació 7  
del 30/06 a 11/08/25

Ocupació 3  
del 16/06 a 03/08/25

Ocupació 5  
del 09/06 a 08/09/25

Ocupació 9  
del 12/06 a 04/08/25

Ocupació 2  
del 12/06 a 19/09/25

Ocupació 1  
del 30/06 a 11/08/25

Extracció de Balast  
del 16/06 a 19/09/25

**Servei alternatiu de bus llançadora 1**, entre Verdaguer i Casa de l'Aigua,  
del 25/06 a 31/08

**Servei alternatiu de bus llançadora 2**, entre Maragall i Casa de l'Aigua,  
del 01/09 a 07/09

**Servei llançadora circular PMR**, entre Verdaguer i Girona,  
del 25/06 a 31/08



# PMR Verdaguer. Fase 1

## Execució de micropilots i pous. Fase 2. del 14/07/25 a 31/10/26

S'afegeix a l'ocupació de la fase 1 el tall de la terçiana del c. Provença al seu pas pel pg. Sant Joan. El desviament sentit Llobregat serà pg. Sant Joan – c. Córsega – c. Bailèn.


### Bici

Tall del carril Bici del c. Provença entre c. Girona i pg. Sant Joan.  
El desviament sentit Besòs serà av. Diagonal – pg. Sant Joan.  
L'itinerari recomanat alternatiu sentit Llobregat serà per c. Nàpols i c. Sicília.  
S'habilitarà un pas segur per les bicis que arribin al punt de tall.





## 7. Pavimentacions

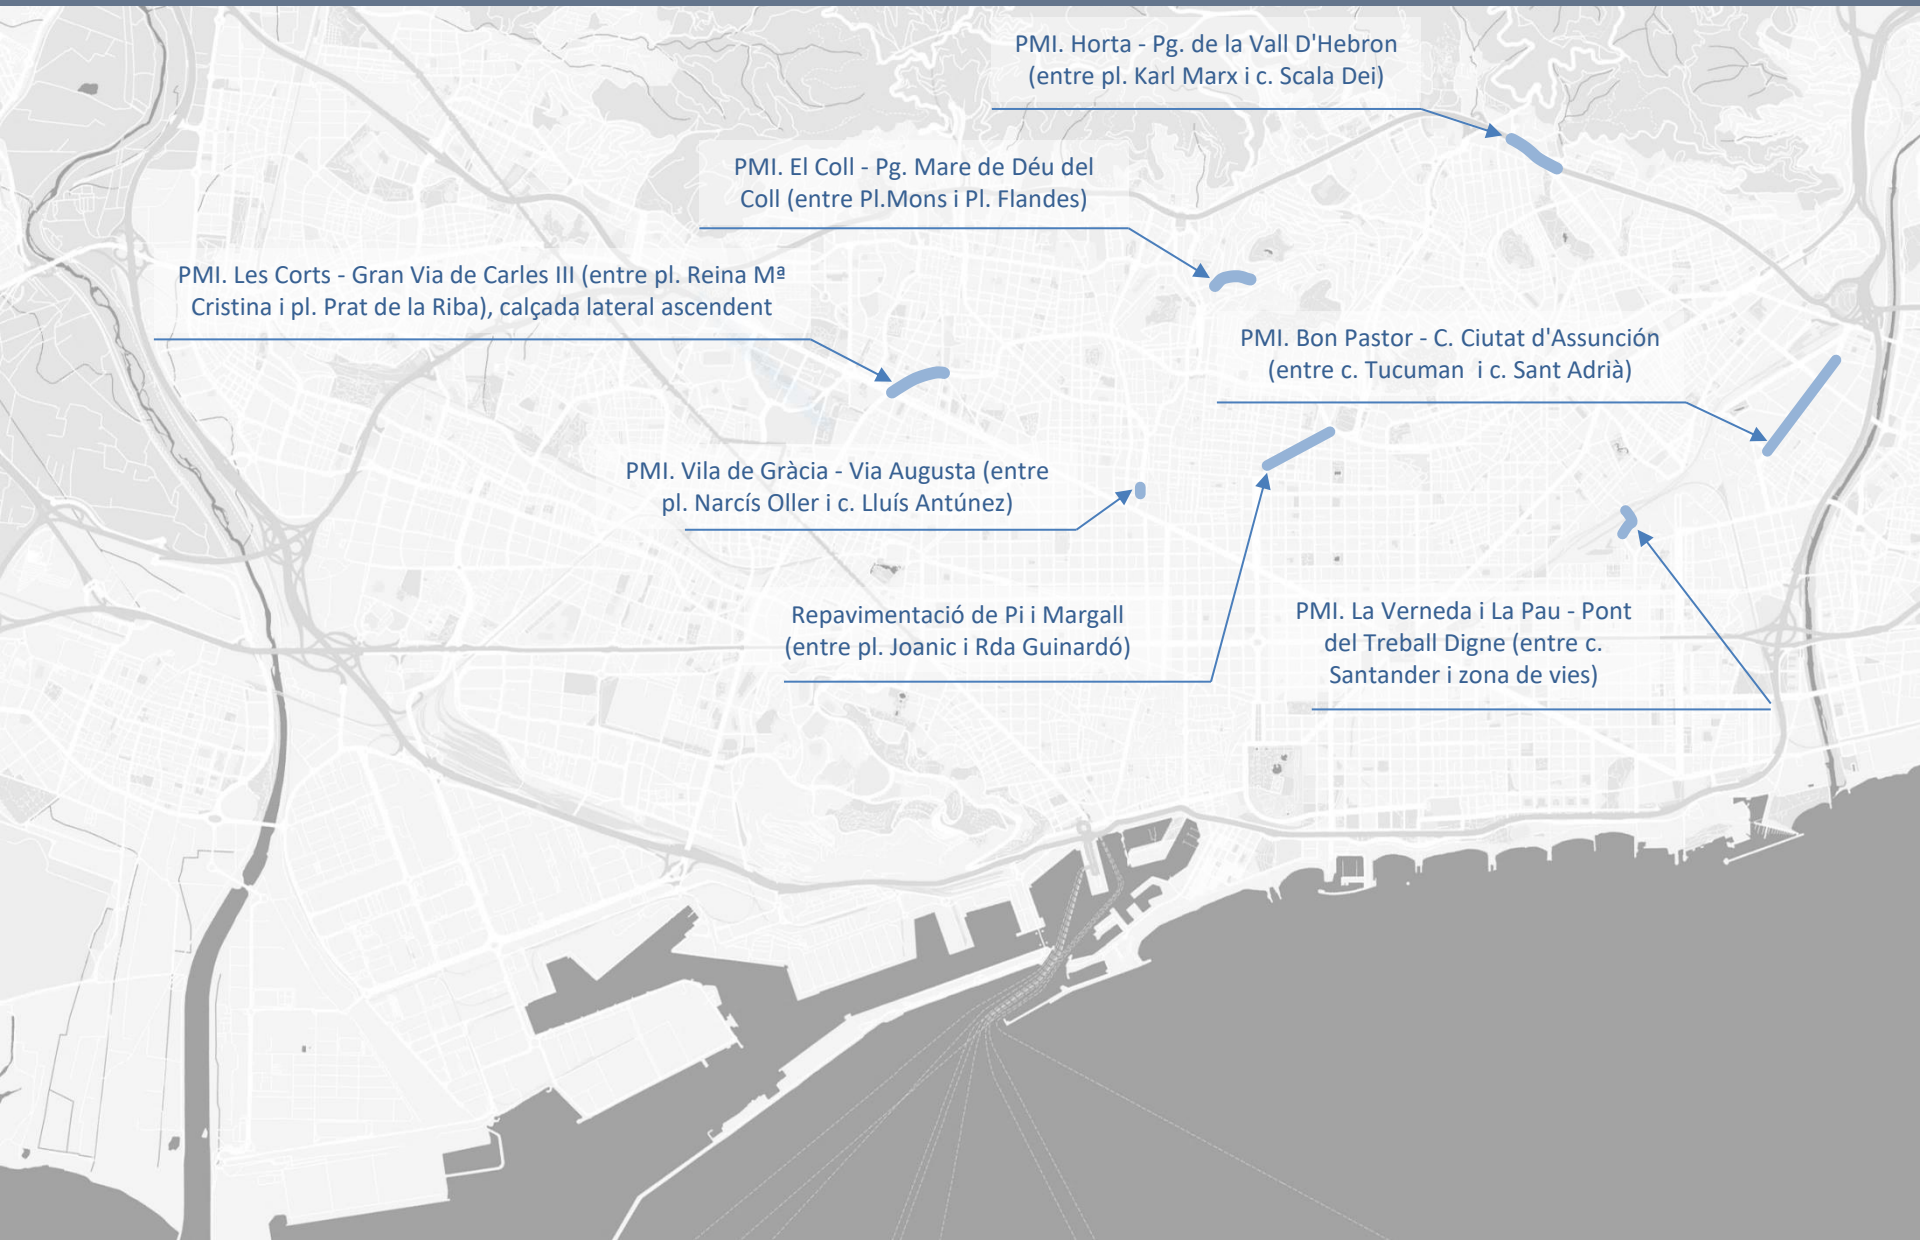



# Repavimentació de Pi i Margall (entre pl. Joanic i Rda Guinardó)

## Del 14/07 a 15/08

Tall del c. Pi i Margall entre c. Escorial i Rda Guinardó.

Desviament sentit ascendent c. Escorial – c. Camèlies – c. Sardanya.

Desviament sentit descendent a c. Sardanya – c. St. Antoni Ma. Claret.

Els carrers transversals quedaran afectats. Caldrà realitzar canvis de sentit per tal de donar accés a tots els guals.

## Bus

### Línia V19. Sentit ascendent

Desviament c. Escorial – c. Camèlies – c. Praga. S'habilita parades alternatives al c. Escorial i c. Camèlies.

### Línia V19. Sentit descendent

Desviament rda. Guinardó – c. Lepant – c. St. Antoni Ma. Claret – pg.St. Joan. S'habilita parades alternatives al c. Lepant i c. St. Antoni Ma. Claret.

### Línia 114. Sentit ascendent

Desviament c. Legalitat – c. Pau Alsina – c. Camèlies. S'habilita parada alternativa al c. Pau Alsina.

### Línia 114. Sentit descendent

Desviament c. Sardanya – c. Providència – c. Alegre de Dalt – c. Encarnació. S'habilita parada alternativa al c. Providència.

### Línia N6. Sentit ascendent

Desviament c. Escorial – c. Camèlies – c. Praga. S'habilita parades alternatives al c. Escorial i c. Camèlies.

### Línia N6. Sentit descendent

Desviament c. Sardanya – c. St. Antoni Ma. Claret.

### Línia llançadora L4. Sentit descendent

Desviament rda. Guinardó – c. Praga – c. Mare Dèu Montserrat - c. Sardanya – c. St. Antoni Ma. Claret – c. Roger de Flor - trav. Gràcia. S'habilita parada alternativa a trav. Gràcia 277.

### Línia llançadora L4. Sentit ascendent

Desviament pg. St Joan - c. Escorial – c. Camèlies – rda. Guinardó. S'habilita parada alternativa a c. Escorial.



## 7. Pavimentacions

\* Pendent confirmar

|                                                                                                                                           | Dates       |             | Juny        | Juliol |             |       |             | Agost       |             |             |       | Setembre    |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|
| Pavimentacions                                                                                                                            | Inici       | Final       | 23-29       | 30-6   | 7-13        | 14-20 | 21-27       | 28-3        | 4-10        | 11-17       | 18-24 | 25-31       | 1-7 | 8-14 |
| PMI. Les Corts - Gran Via de Carles III (entre pl. Reina M <sup>a</sup> Cristina i pl. Prat de la Riba), calçada lateral sentit ascendent | 29/06/2025  | 29/06/2025  | <div></div> |        |             |       |             |             |             |             |       |             |     |      |
| PMI. Vila de Gràcia - Via Augusta (entre pl. Narcís Oller i c. Luis Antúnez)                                                              | 13/07/2025  | 13/07/2025  |             |        | <div></div> |       |             |             |             |             |       |             |     |      |
| PMI. El Coll - Pg. Mare de Déu del Coll (entre Pl.Mons i Pl. Flandes)                                                                     | 3/08/2025   | 3/08/2025   |             |        |             |       |             | <div></div> |             |             |       |             |     |      |
| PMI. Bon Pastor - C. Ciutat d'Assunción (entre c. Tucuman i c. Sant Adrià)                                                                | *18/08/2025 | *23/08/2025 |             |        |             |       | <div></div> |             |             |             |       | <div></div> |     |      |
| PMI. La Verneda i La Pau - C. Pont del Treball Digne (entre c. Santander i zona de vies)                                                  | *4/08/2025  | *16/08/2025 |             |        |             |       |             |             | <div></div> | <div></div> |       |             |     |      |
| PMI. Horta - Pg. de la Vall D'Hebron (entre pl. Karl Marx i c. Scala Dei)                                                                 | *14/07/2025 | *27/07/2025 |             |        | <div></div> |       | <div></div> |             |             |             |       |             |     |      |
| Repavimentació de Pi i Margall (des de pl. Joanic fins a Rda Guinardó)                                                                    | 14/07/2025  | 8/08/2025   |             |        | <div></div> |       |             |             |             | <div></div> |       |             |     |      |



## 8. Infraestructures de Serveis Elèctriques / Aigua potable / Gas Natural / Sanejament / Districlima





# DISTRICLIMA. Xarxa Troncal Central Bogatell

## Fase 2. Del 30/06/2025 a 01/08/2025

Ocupacions Fase 3A més:  
C. Carmen Amaya, entre Jaume Vicens i Vives i Bisbe Climent. Ocupació dels 2c banda muntanya. Caldrà habilitar el sentit Llobregat als dos carrils banda mar.  
Afectació davant de les escoles La Mar Xica i Vila Olímpica

## Fase 3A. Del 02/06 a 05/09/25

Tall del sentit Llobregat del c. Carmen Amaya, entre el c. Bisbe Climent i el ptg. Llacuna. El desviament serà passatge de la Llacuna – carrer de Salvador Espriu - carrer de Jaume Vicens i Vives.

## Bus

Afectació de les línies H16, V25, V27 i N28.

## Fase 3B. De l' 11/08/2025 a 05/09/2025


Ocupacions Fase 3A, més banda mar del c. Carmen Amaya.  
El desviament de trànsit sentit Besòs serà c. Jaume Vicens i Vives – av. d'Icària – c. Bisbe Climent – c. Carmen Amaya – c. Jaume Vicens i Vives – av. Litoral – ptge. Llacuna.



(Fase 1. Ocupació banda mar de Quatre Camins, mantenint 1c sentit Besòs )



# 9. Pla de Manteniment Integral 2025

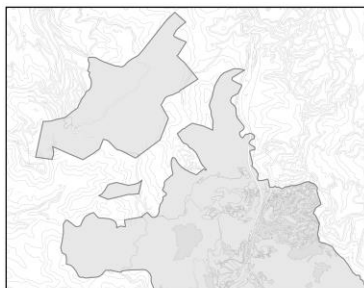

ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

PLANOL DEL CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2025


Data d'actualització: 18 / 06 / 2025

Escala de planta general 1 : 40.000 / Escala de detall 1 : 60.000 / Format Din A3

## LLEGENDA



PMI

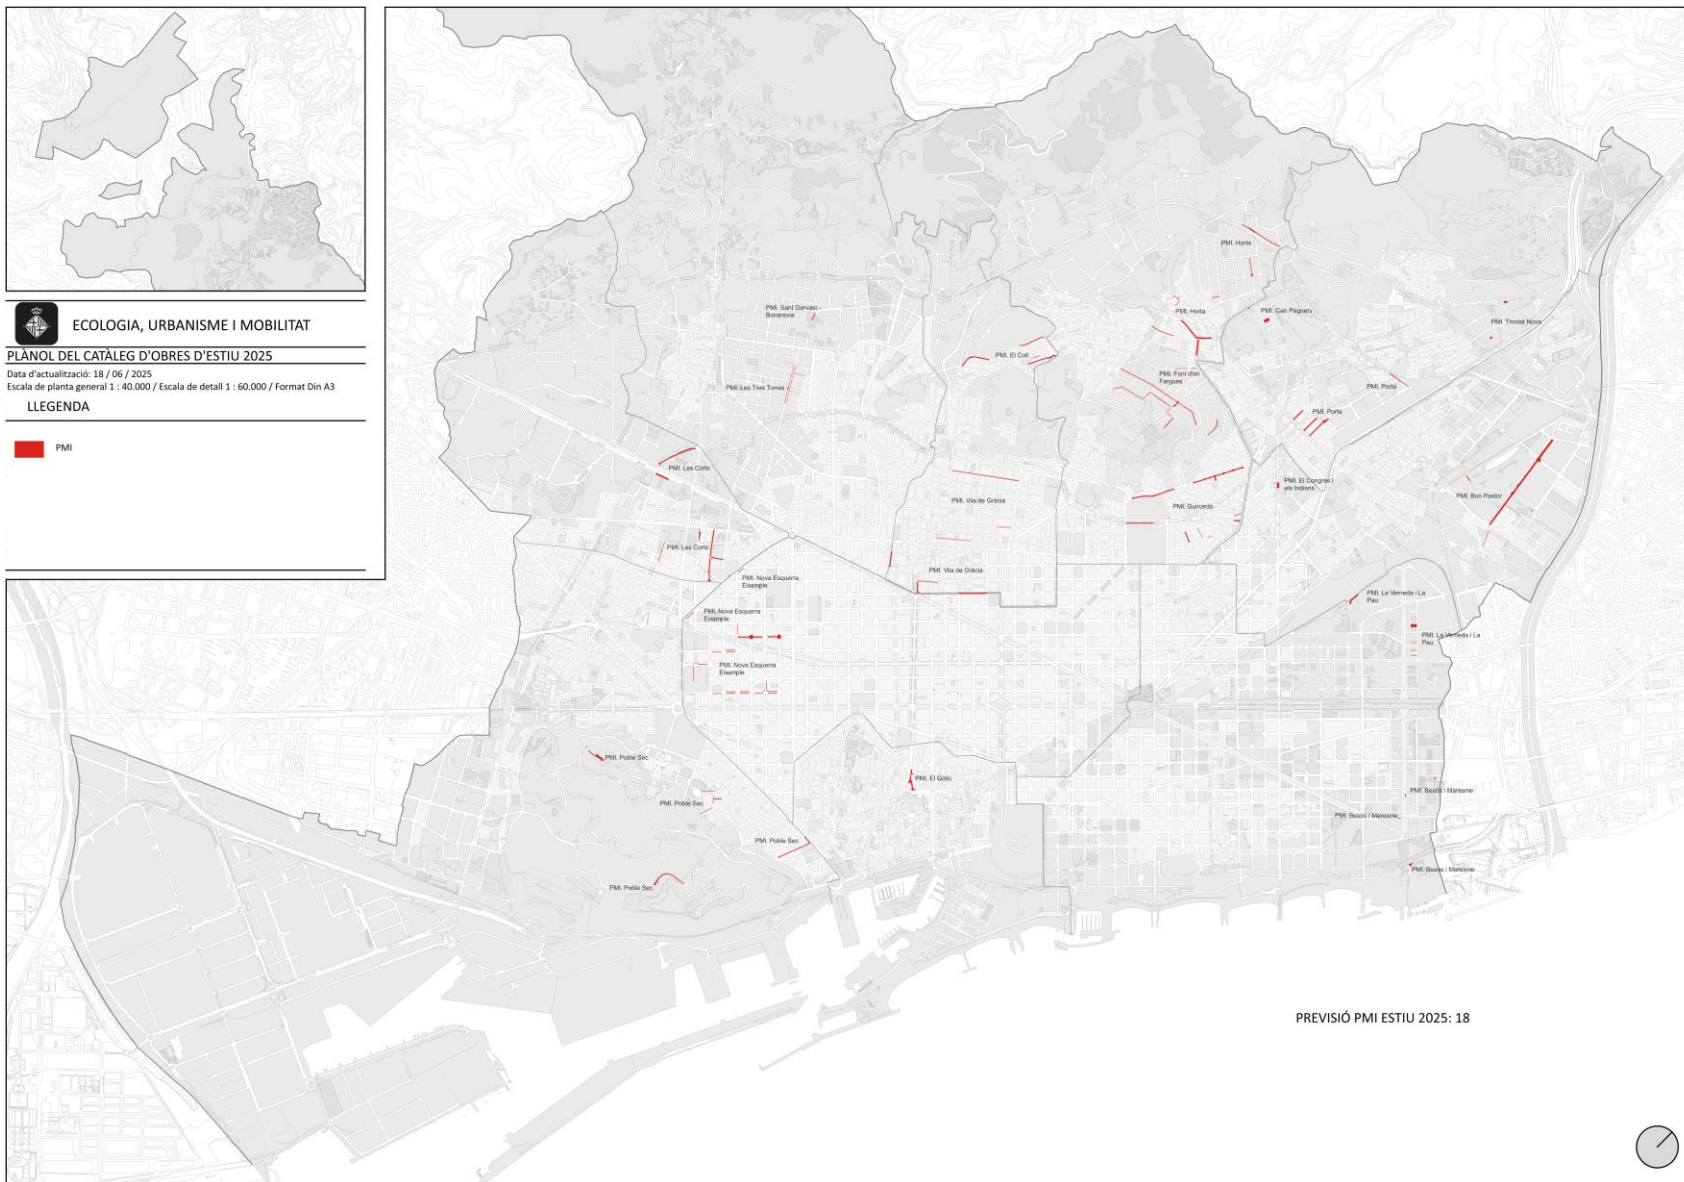

PREVISIÓ PMI ESTIU 2025: 18





## 10. Pla Endreça Obres d'Estiu

- Durant el període d'estiu es realitzarà un seguiment especial de les obres presents en el catàleg
- Es realitzarà visites de seguiment de les obres de forma setmanal
- Durant les visites de seguiment es realitzarà avaluació de l'estat de l'obra: tancaments, afeccions a trànsit, afeccions a la mobilitat de vianants i bicicletes, i afeccions al medi ambient



Ajuntament  
de Barcelona

# CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2025

19 de juny de 2025  
[comiteobres@bcn.cat](mailto:comiteobres@bcn.cat)
